


全体計画平面図

(原案・修正案重ね合わせ)

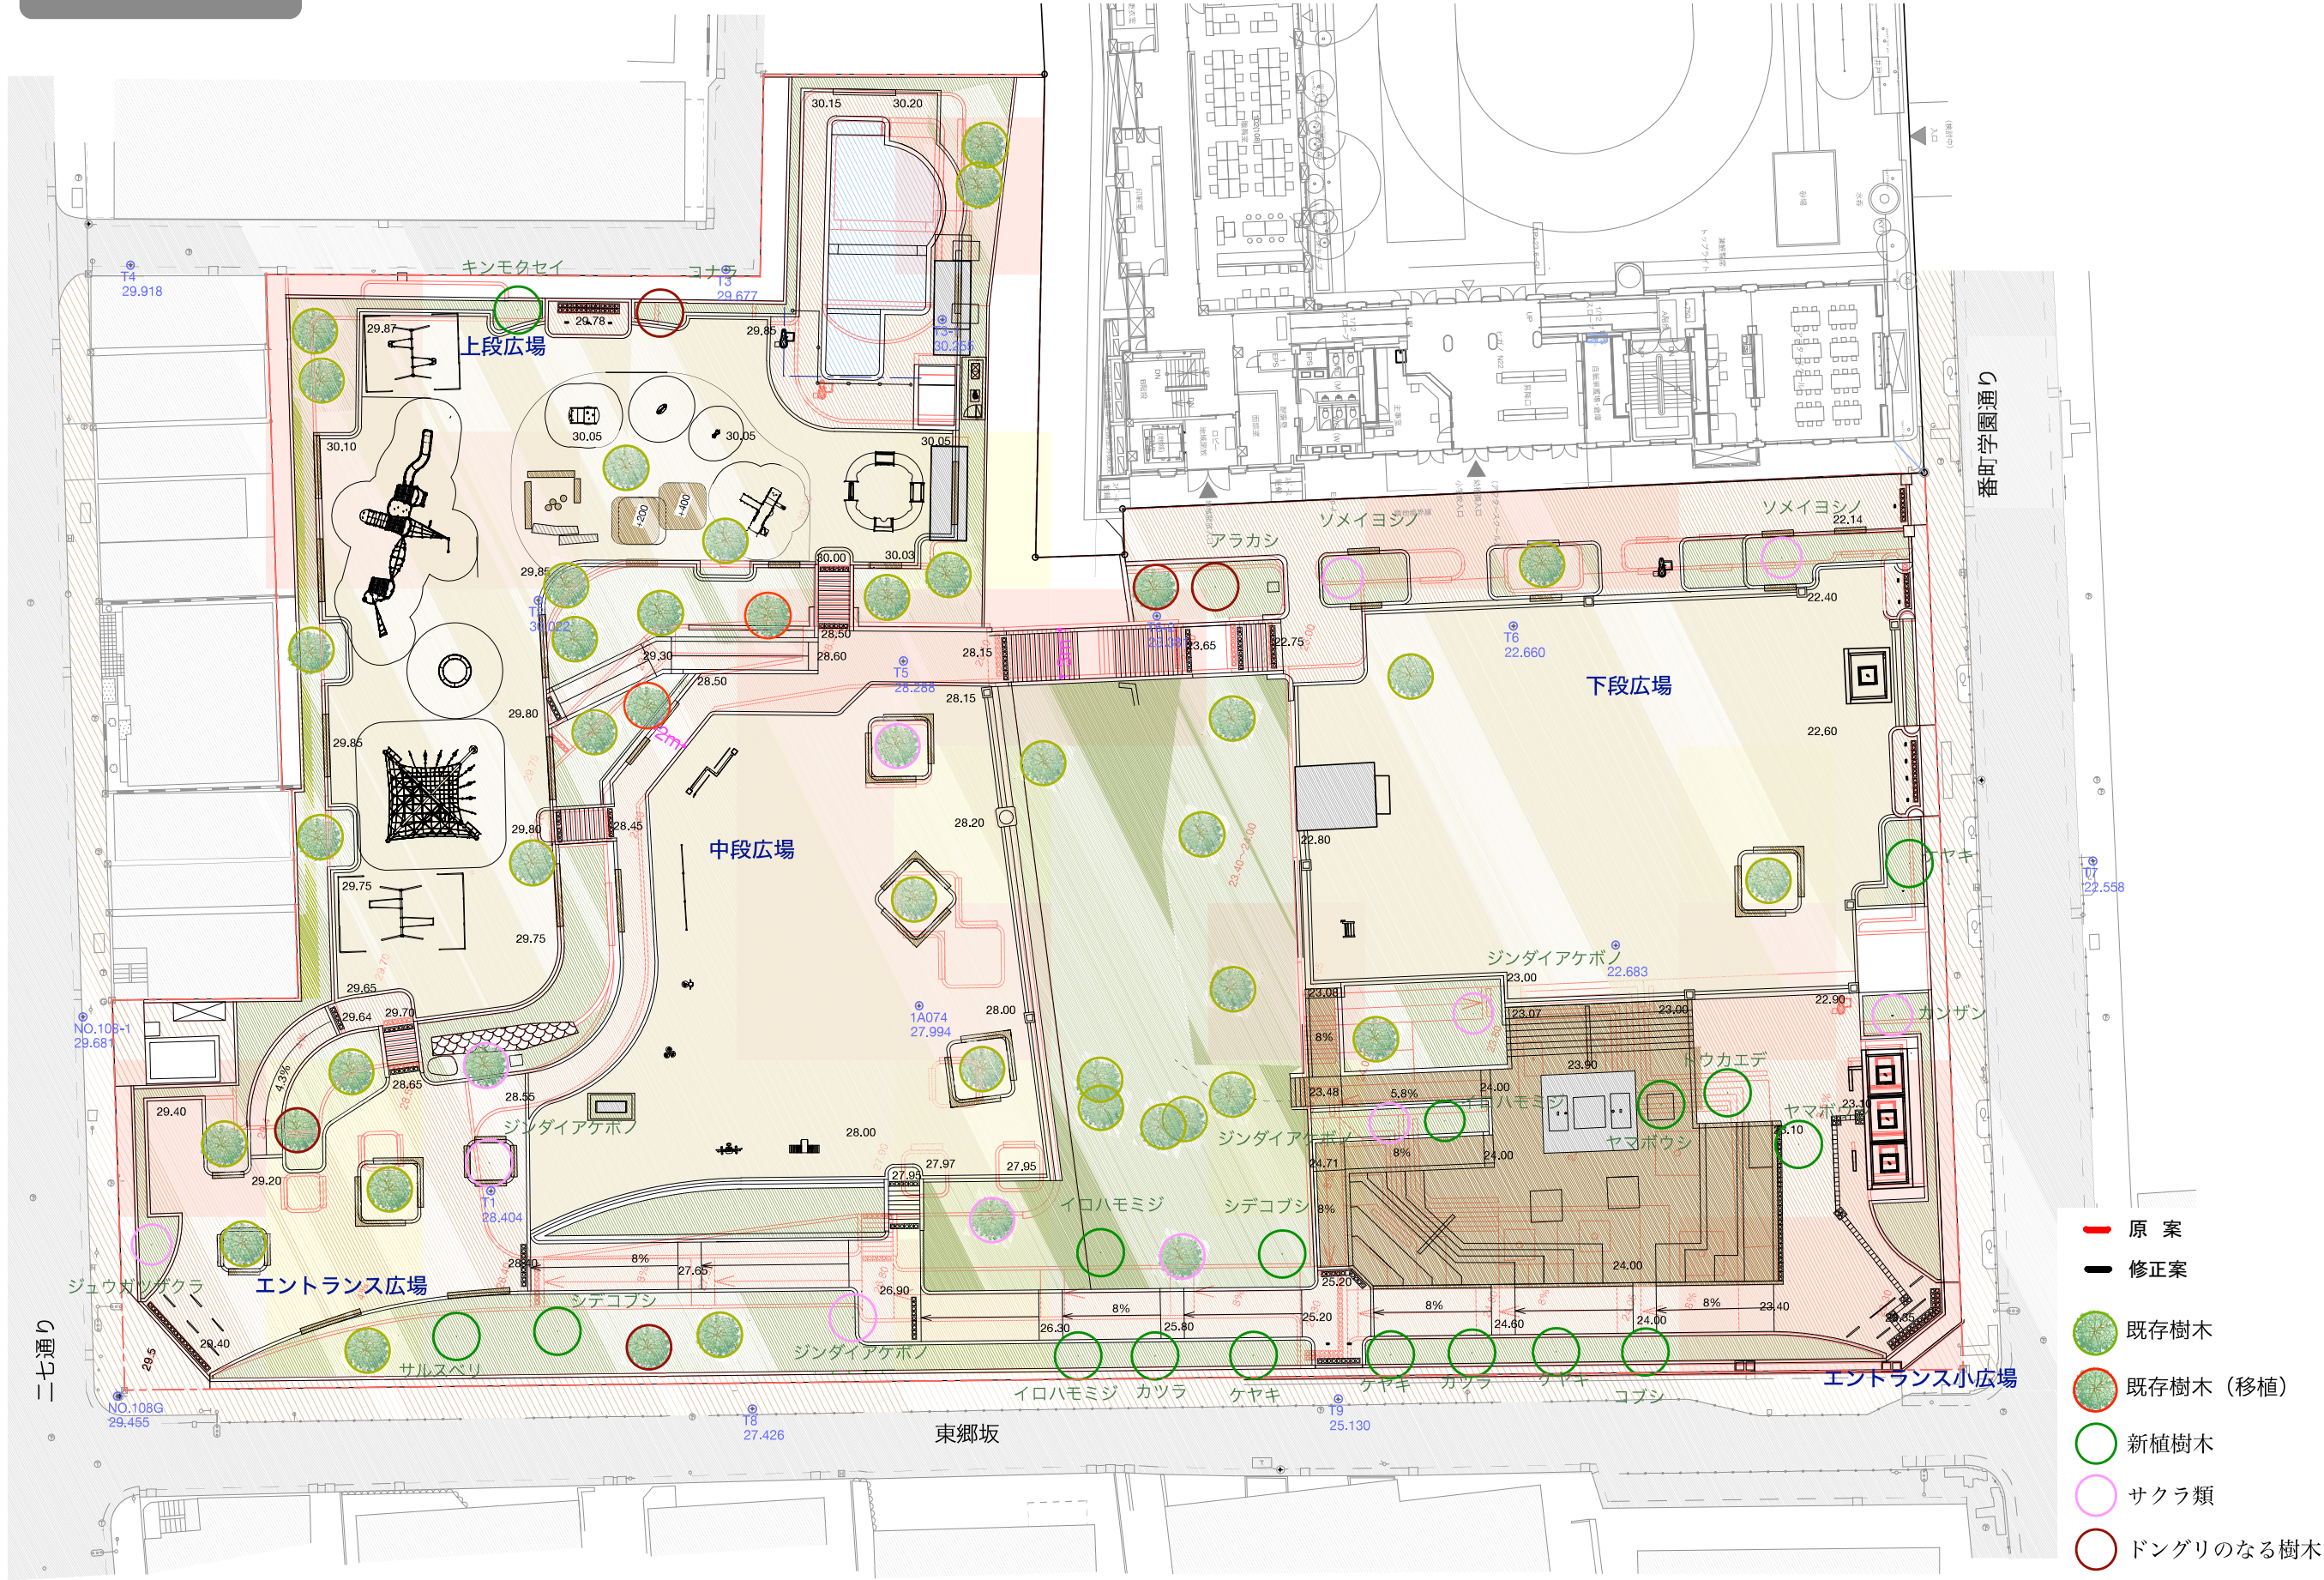

東郷元帥記念公園下段広場修正案 模型写真

■上からの下段広場全体



①番町学園通り側から見た全体デザイン



②番町学園通り九段小学校側出入口デザイン




③斜面緑地から見たデザイン



4 今後のスケジュールについて

- 東郷元帥記念公園改修整備工事の当初工事完了時期は、平成 31 年 12 月までとしていましたが、「鉛等」の基準値超過により工事を中断し、土壌調査を行いました。
- 土壌調査のため概ね平成 30 年 7 月から工事中断をしていましたが、令和 2 年 4 月より再開しました。
- 全体工事期間としては、再開後、概ね 2 年間の延伸となります。
- 撤去工事の事前調査において、コンクリート塀からアスベストが検出されたため、土壌対策工事前の 7 月に除去工事を行いました。
- 8 月より土壌汚染対策工事を開始しています。

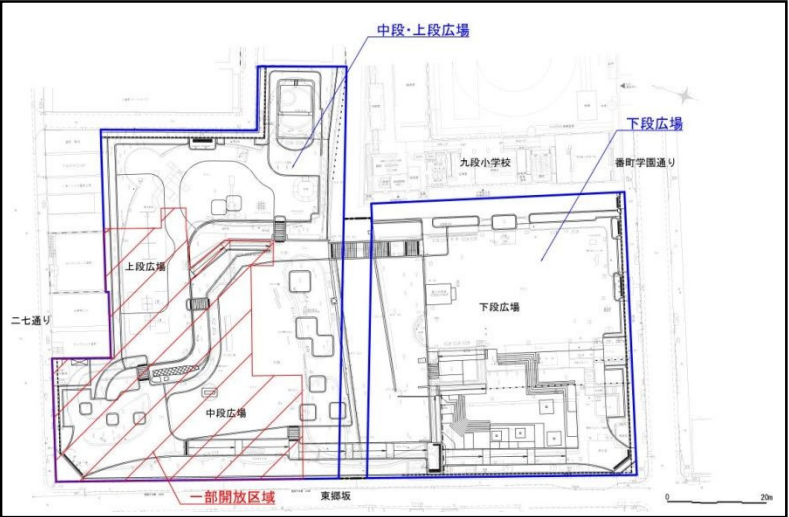

□東郷元帥記念公園 全体工事スケジュール案

項目	2019(R1 年度) 1 月	4 月	7 月	2020(R2 年度) 10 月	1 月	2021(R3 年度)	2022(R4 年度)
主な行事等						東京オリ・パラ大会	
協議会 設計見直し				■ 第 18 回協議会（本日） 現況樹木の取扱い方針に基づいた公園設計の見直しの検討 ■ 次回協議会 第 18 回協議会で出たご意見を踏まえて、最終計画案の決定			
中段・上段 広場				一部開放		土壌対策・中段・上段広場改修工事	東郷元帥記念公園 全面開放
下段広場	工事中断	樹木の伐採 及び 撤去工事	アスベスト 除去工事	土壌対策工事	下段広場改修工事	下段広場開放	

※上記スケジュールは、変更になる場合があります。
