

## 東郷元帥記念公園改修工事検討協議会（第24回）

- ① これまでの検討経緯
- ② 第23回協議会の議事要旨について
- ③ 報告事項
  - 1) 今年度の工事状況と今後の工事予定
  - 2) 土壌汚染対策工事状況
  - 3) 仮設通路工事及び開放について
  - 4) 樹木の安全対策
  - 5) 遊具について
  - 6) 令和5年度下段広場活用事例

令和6年3月28日



# 1 これまでの検討経緯

平成27年度から現在までに23回の協議会を実施してきました。第24回協議会では工事状況と今後の工事予定、仮設通路の開放、遊具、下段広場の活用事例等について報告します。

	平成27年度				平成28年度					平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	基本設計				実施設計					協議調整			工事監理		修正設計		工事監理											
	2015年		2016年			2017年			2018年		2019年		2020年		2021年		2022年			2023年	2024年							
	第1回 (12.10)	第2回 (12.21)	第3回 (1.25)	第4回 (3.15)	第5回 (4.26)	第6回 (6.28)	第7回 (8.9)	第8回 (10.18)	第9回 (11.15)	第10回 (2.15)	第11回 (4.25)	第12回 (7.4)	第13回 (1.11)	第14回 (8.7)	第15回 (2.6)	第16回 (10.29)	第17回 (2.13)	第18回 (8.7)	第19回 (9.8)	書面 報告 (7.6)	第20回 (11.15)	第1回 イベント (11.27)	見学会 (3.31)	第21回 (6.7)	第22回 (11.2)	第2回 イベント (12.4)	第23回 (7.18)	第24回 (3.28)
協議項目	コンセプト	現地見学会			基本設計決定																							
	ゾーニング	現地見学会			基本設計決定																							
	動線計画	現地見学会			基本設計決定																							
	植栽計画					実施設計決定					改修プラン決定																	
	施設整備計画					実施設計決定					改修プラン決定																	
	舗装計画					実施設計決定					改修プラン決定																	
	照明計画					実施設計決定					改修プラン決定																	
調査	樹木調査					2016.7 樹木簡易診断調査					公園工事着工		2019.9~12 樹木調査															
	ボタニカル調査					2016.7 土質調査					公園工事着工		2019.9~12 樹木調査															
	土壌調査					2016.7 土質調査					公園工事着工		2018.7~12 土壌調査															
工事	東郷公園工事										公園工事着工		2018.7~工事中断		2020.4~下段広場工事再開		修正内容報告			変更内容報告			下段広場利用再開			2022.4~上中段広場工事		
	九段小学校舎整備工事										公園工事着工		2018.9~開校															
確認された内容	設計コンセプト ・歴史性の継承	継承すべき施設 ・現状の公園の課題	斜面形状・遊具配置改善 ・歩行計画の改善	基本的な動線計画 ・ゾーニング ・斜面形状	斜面の使い方	基本的な形状(素案)	全体計画 ・基本的な形状(詳細) ・自転車スペース	下段広場ベンチ ・転落防止柵 ・公園の禁煙	ウッドデッキ位置 ・子供の遊び場事業 ・アダプト制度導入	各広場の施設の配置	全体計画 ・遊具	遊具の安全性、配置、維持管理	施設計画 ・工事計画 ・工事の住民への周知方法	土壌汚染と今後の調査方法	土壌汚染の対応策 ・樹木保全に対する陳情	土壌汚染と保全樹木の取扱い方針	土壌汚染と保全樹木の取扱い方針の決定	デッキ方針(縮小案)の決定	全体計画 ・平面図の決定	公園改修 修正内容 ・今後の工事予定	イベント開催検討 ・保全樹木に関する設計変更 ・トイレ開放時間	デッキ焼印 ・体験 ・デッキサイ ンイベント等	下段広場	工事現状等の報告 ・遊具及びイベント開催等	下段広場状況 ・上中段広場計画 ・第2回イベント等	焼き芋づくり体験 ・薪割り・スト ーブコー ナー ・公園紹介 コーナー ・その他	今後の工事予定 ・ライオン 像の補修 ・公園施設 変更 ・下段広場 利用状況等	工事状況 ・今後の工事 予定 ・仮設通路 の開放 ・遊具 ・下段広場 活用事例 他


今回協議会

## 2 第23回協議会の議事要旨について

前回の協議会において公園改修工事内容に関して頂いたご意見とその対応は以下のとおりです。

意見	回答
<p><b>①ベンチについて</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子どもや高齢者もこのベンチを使用することを鑑みると、ベンチの肘掛けが多様な使い方を排除している可能性もある。そのことについても検討してほしい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>多くの利用者の多様な使い方に配慮し、遊具が設置されている上段広場と背面に構造物がある場所は背付きベンチとし、また比較的ゆっくり過ごすことが想定される広場内に設置するベンチについては肘掛けなしに変更しました（次頁参照）。</li> </ul>
<p><b>②仮設通路について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>仮設通路の出入口が東郷坂の勾配が激しい部分に面しており危険だと思う。出入口を二七通りに面する箇所まで伸ばし、交差点の際まで行けるようにすべきではないか。</li> <li>約20mの区間に同じような仮設通路をつくるのは難しいかもしれないが、公園側に歩道を広げることができないか。</li> <li>工事車両は頻繁に出入りするわけではないため、例えば監視員・交通整理員を配置する手段もある。</li> <li>帰宅の時間帯に信号部が混雑してしまうと思うので、実情にあわせて前向きに検討してほしい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>頂いたご意見を基に仮設通路整備内容及び開放方法について再検討しました。</li> <li>仮設通路整備に伴い、東郷坂沿いに設置していた仮囲いを公園内に移動し、東郷坂の歩道すべて通行できるように変更しました（これまでの有効幅員より50cm広くなっています）。</li> </ul> <p>※工事状況及び開放については、本協議会の3報告事項の3)にて報告します。</p>
<p><b>③ライオン像の補修について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>劣化保護用コーティングについて、失敗したら取り返しがつかないため、慎重に考える必要がある。国会議事堂の砂岩とは状況が異なるため、砂岩でできた他のもので試験施工したほうがよい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ライオン像と同様の砂岩に劣化保護用コーティングを塗布したものを用意し、室内と室外にて暴露試験を実施し、約5か月が経過しました。コーティングの有無に関わらず、室外の方が少し赤味が増していますが、コーティングの劣化等は特に見られません。令和7年の秋頃ライオン像の設置を予定していますので、それまで経過を観察する予定です。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="1486 1100 1923 1430"> </div> <div data-bbox="1929 1100 2338 1430"> </div> <div data-bbox="2344 1100 2822 1430"> </div> </div> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>試験開始時（2023/10/13）の状況</span> <span>試験開始から5か月経過後（2024/03/11）</span> </p>
<p><b>④ライオン像の銘板の保管について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ライオン像の銘板については、千代田区役所で保管・展示するのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>九段小学校にて、保管・展示を検討しております。</li> </ul>
<p><b>⑤工事予定の掲示について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>工事が大幅に遅れていることについて、今どのような状況なのかに加え、今後の工程の一覧をわかるように公園に掲示してほしい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>東郷元帥記念公園改修工事のホームページ及びnoteにて、週間工程表をいつでも閲覧できるようになりました。毎週金曜日に更新しています。</li> </ul> <p>HP：<a href="https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/koen/togogensuikinenkoen-kaishu.html">https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/koen/togogensuikinenkoen-kaishu.html</a>  note：<a href="https://note.com/togo_park/">https://note.com/togo_park/</a></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="2148 1755 2288 1885"> </div> <div data-bbox="2294 1835 2377 1864"> <p>区HP</p> </div> <div data-bbox="2466 1755 2605 1885"> </div> <div data-bbox="2611 1835 2694 1864"> <p>note</p> </div> </div>

■ベンチ配置図

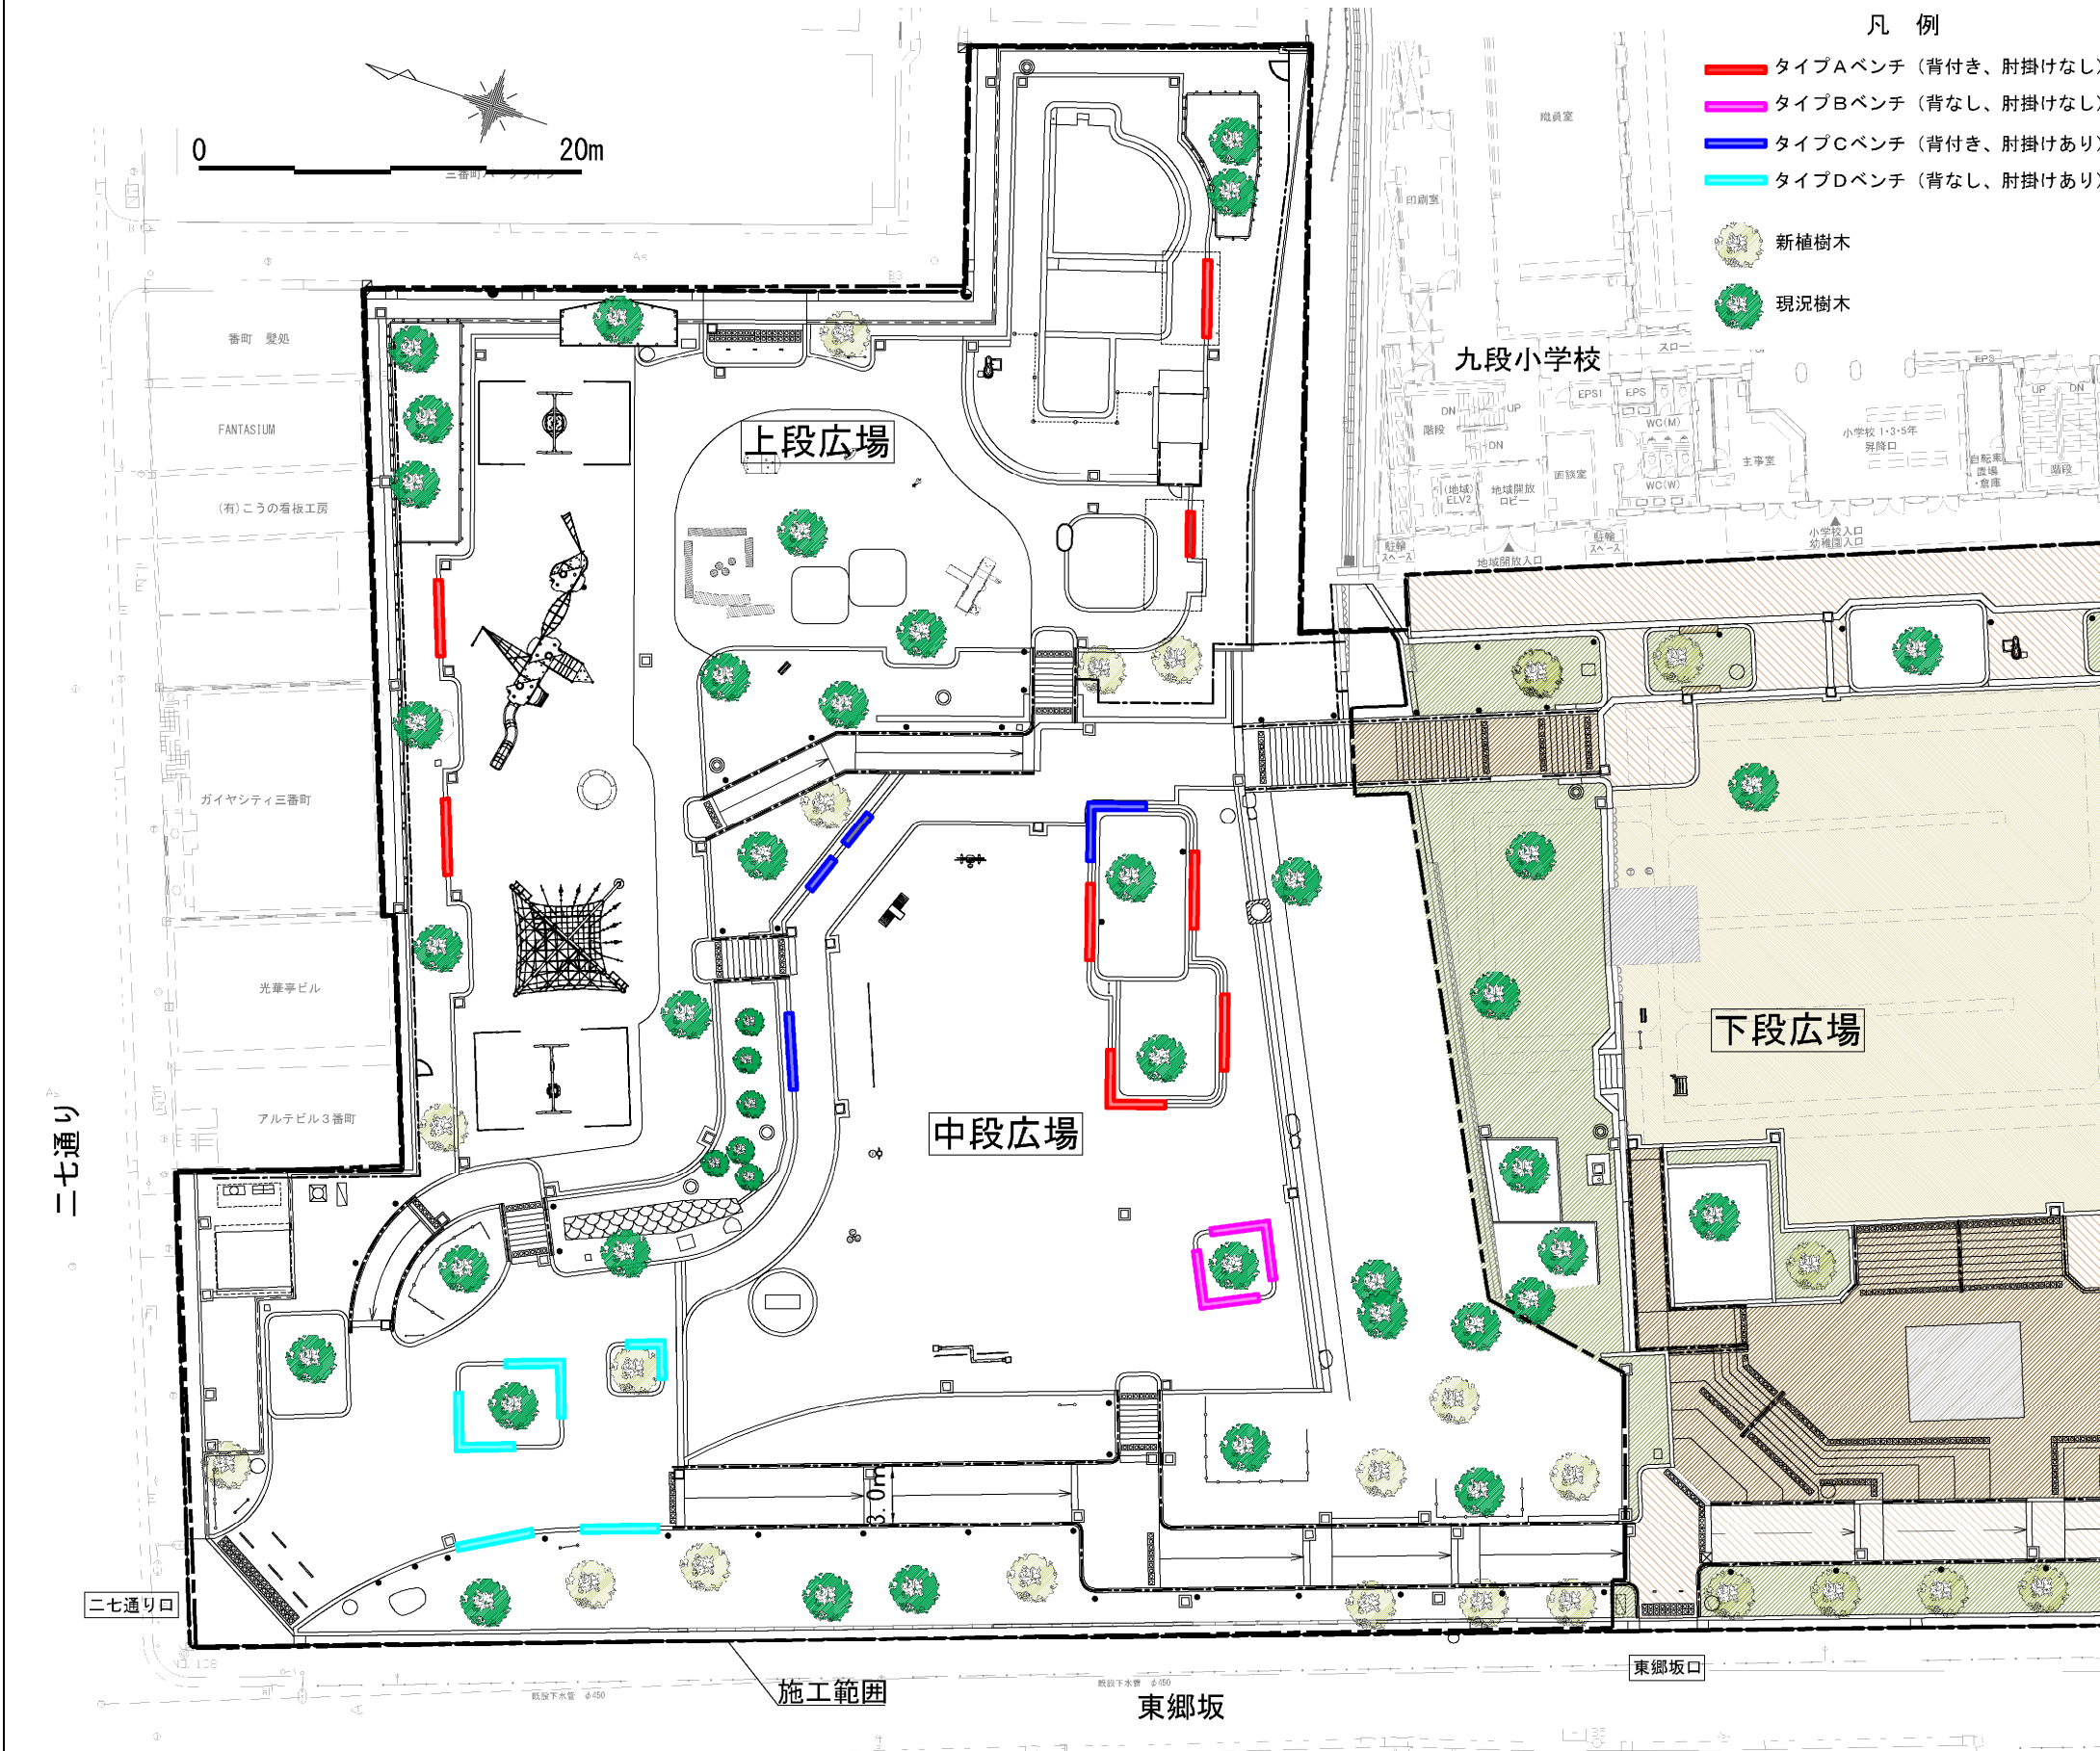

タイプA：背付き、肘掛けなしベンチ



タイプB：背なし、肘掛けなしベンチ



タイプC：背付き、肘掛け付きベンチ



タイプD：背なし、肘掛け付きベンチ

